


Zakres zaplanowanych prac w obszarze inwestycji Program Centrum listopad 2022 r.

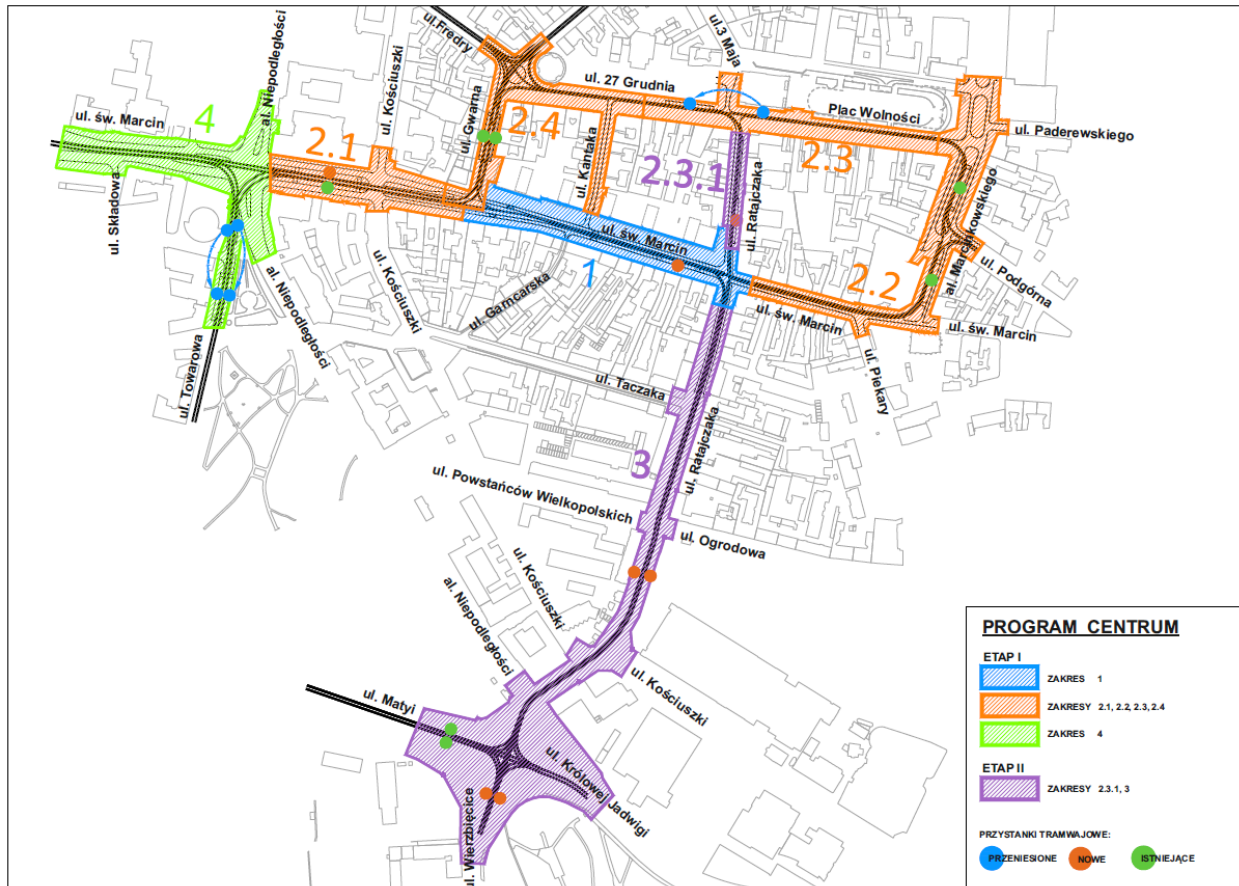

1. ul. Św. Marcin (od Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego)

- Układanie nawierzchni z kostki kamiennej chodnika po stronie południowej na ul. Św. Marcin pomiędzy Alejami Marcinkowskiego a ul. Ratajczaka (bez robót związanych z przebudową skrzyżowania ulic Św. Marcina i Ratajczaka) 02-30.11.2022
- układania nawierzchni autorskiej chodnika po stronie północnej przy skrzyżowaniu z Alejami Marcinkowskiego 02-30.11.2022
- Roboty trakcyjne na ul. Św. Marcin (bez robót związanych z przebudową skrzyżowania ulic Św. Marcina i Ratajczaka) 02-30.11.2022
- Zakończenie robót oświetleniowych na słupach oświetleniowo-trakcyjnych – ostateczne odbiory z gestorem sieci do 16.11.2022.

2. ul. Piekary

- a. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej 14-16.11.2022

3. Al. Marcinkowskiego

- a. Wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika po stronie wschodniej pomiędzy ul. Podgórną i ul. Paderewskiego 02-10.11.2022
- b. Wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej chodnika po stronie wschodniej na odcinku od ul. Podgórną do ul. Paderewskiego 14-30.11.2022
- c. Wykonywania nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na jezdni wschodniej pomiędzy ulicami Podgórną i Paderewskiego 15-30.11.2022
- d. Kontynuacja przebudowy kanalizacji kablowej 02-25.11.2022
- e. Zakończenie robót oświetleniowych na słupach oświetleniowo-trakcyjnych – ostateczne odbiory z gestorem sieci do 16.11.2022
- f. Regulacja wpustów przed robotami brukarskimi – na bieżąco wraz z postępem robót brukarskich
- g. Montaż wiat peronowych 02-04.11.2022
- h. Montaż błotochronów 21-30.11.2022
- i. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż przystanków tramwajowych 14-30.11.2022

4. Ul. Fredry

- a. Układanie płyt torowych na odcinku od Most Teatralny – Niepodległości-Kościuszki-Gwarna 02.11.-30.11.
- b. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni bitumicznej wzdłuż torowiska – 17.11-30.11
- c. Frezowanie pozostałej istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej 20.11-30.11
- d. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na peronie i przystanku „TEATRALKĄ” 03.11-15.11
- e. Antykorozja profilu pod balustradą na moście Teatralnym 03.11-06.11
- f. Budowa kanalizacji ogólnospławnej do placu Gwarnego 02.11-20.11
- g. Usuwanie kolizji teletechnicznych i energetycznych 02.11-30.11

5. Ul. Gwarna

- a. Budowa Kanalizacji ogólnospławnej

- b. Budowa wodociągu strona L i P 02.11-30.11
- c. Budowa i przebudowa kanalizacji teletechnicznej – 02.11-15.11
- d. Budowa konstrukcji torowiska – 07.11-30.11

6. Ul. Mielżyńskiego

- a. Budowa kanalizacji ogólnospławnej - do 10.11
- b. Renowacja wodociągu – 02.11-30.11
- c. Opcjonalnie – przebudowa podziemnych kabli energetycznych 02.11-15.11

7. Plac Gwarny

- a. Rozebranie nawierzchni 15.11-20.11
- b. Roboty ziemne – 20.11-30.11
- c. Usunięcie kolizji teletechnicznych, energetycznych 05.11-30.11
- d. Budowa kanalizacji ogólnospławnej (połączenie Fredry i ul. Mielżyńskiego) oraz podłączenie do kanału w ul. 27 Grudnia 15.11-30.11
- e. Przebudowa sieci Wodociągowej 15.11-30.11

8. Ul. 27 Grudnia

- a. Rozebranie istniejącego torowiska od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka 02.11-9.11
- b. Przesadzenie 14 szt Leszczyn w nową lokalizację 15.11-22.11
- c. Przebudowa Gazociągu od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka 04.11-30.11
- d. Przebudowa Ciepłociągu 15.11-30.11
- e. Rozpoczęcie usuwania i przebudowy kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych 12.11-30.11

9. Ul. Kantaka

- a. Przebudowa i Renowacja sieci Kanalizacji wraz z przyłączami 02.11-30.11
- b. Rozpoczęcie Przebudowy Gazociągu – 20.11-30.11
- c. Rozpoczęcie Przebudowy kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych 13.11-30.11

10. Skrzyżowanie Święty Marcin – Ratajczaka

- a. Wprowadzenie organizacji ruchu 2.11.2022
- b. Wykonanie rozbiórek nawierzchni jezdni i chodników 03.11-09.11
- c. Rozebranie torowiska 05.11-9.11

- d. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych 09.11-30.11
- e. Roboty Ziemne – 12.11.-30.11.
- f. Kanalizacja ogólnospławna – 15.11.-30.11
- g. Roboty brukarskie na styku zakresów – 20.11.-30.11

*Na ulicy Ratajczaka i Plac Wolności nie przewiduje się Prac w m. Listopadzie 2022.r

11. Ul. Św. Marcin (4 PC od Gwarnej do Kościuszki)

- a. Układanie kostki Gabro – jezdnia 07.11-18.11
- b. Układanie kostki Gabro w torowisku – 02.11-04.11
- c. Układanie kostki kamiennej - chodnik strona południowa 21.11-30.11

12. ul. Kościuszki

- a. Wykonanie podlewu na skrzyżowaniu Św. Marcin/Kościuszki 02.11.2022
- b. Beton nawierzchniowy - torowisko 14.11-15.11

13. ul. Św. Marcin (od Kościuszki do al. Niepodległości)

- a. Roboty brukarskie – perony 02.11-16.11
- b. Montaż elementów ogrodzenia CK Zamek 02.11-18.11
- c. Wykonanie warstw bitumicznych (AC22P i AC16W) - jezdnie pn i pd 14.11-16.11
- d. Budowa kanalizacji teletechnicznej 02.11-25.11
- e. Nabudowanie studni na istniejącym kolektorze kanalizacji ogólnospławnej 24.11-30.11

14. Al. Niepodległości

- a. Rozbiórka istniejącej nawierzchni 07.11-10.11
- b. Roboty ziemne pod konstrukcję jezdni - strona zachodnia 21.11-23.11
- c. Wykonanie warstw podbudowy - jezdnie zachodnia 24.11-30.11
- d. Wykonanie warstw bitumicznych (AC22P i AC16W) - jezdnie wschodnia 16.11-17.11
- e. Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne 03.11-10.11

15. Św. Marcin (od Mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości)

- a. Montaż szyn 03.11-04.11
- b. Oklejanie szyn bloczkami i przygotowanie do podlewu 07.11-08.11
- c. Wykonanie podlewu 09.11-10.11

- d. Beton nawierzchniowy - torowisko 14.11-17.11
- e. Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne 03.11-04.11
- f. Budowa wpustów drogowych 07.11-09.11
- g. Budowa sieci wodociągowej 02.11-16.11

16. ul. Towarowa

- a. Prace ziemne w konstrukcji torowiska 07.11.2022 i 14.11
- b. Wykonanie odwodnienia torowiska 08.11-14.11
- c. Wykonanie warstw podbudowy – torowisko 15.11-18.11
- d. Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego 21.11-22.11
- e. Montaż płyt prefabrykowanych 23.11-25.11
- f. Kutwienie szyn 28.11-29.11
- g. Wykonanie podlewu 30.11
- h. Wykonanie fundamentów pod słupy trakcyjne 03.11-10.11
- i. Roboty brukarskie – perony 14.11-18.11
- j. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 14.11-30.11
- k. Budowa kanału ogólnospławnego 14.11-18.11
