


# Zakres zaplanowanych prac w obszarze inwestycji Program Centrum lipiec 2023 r.

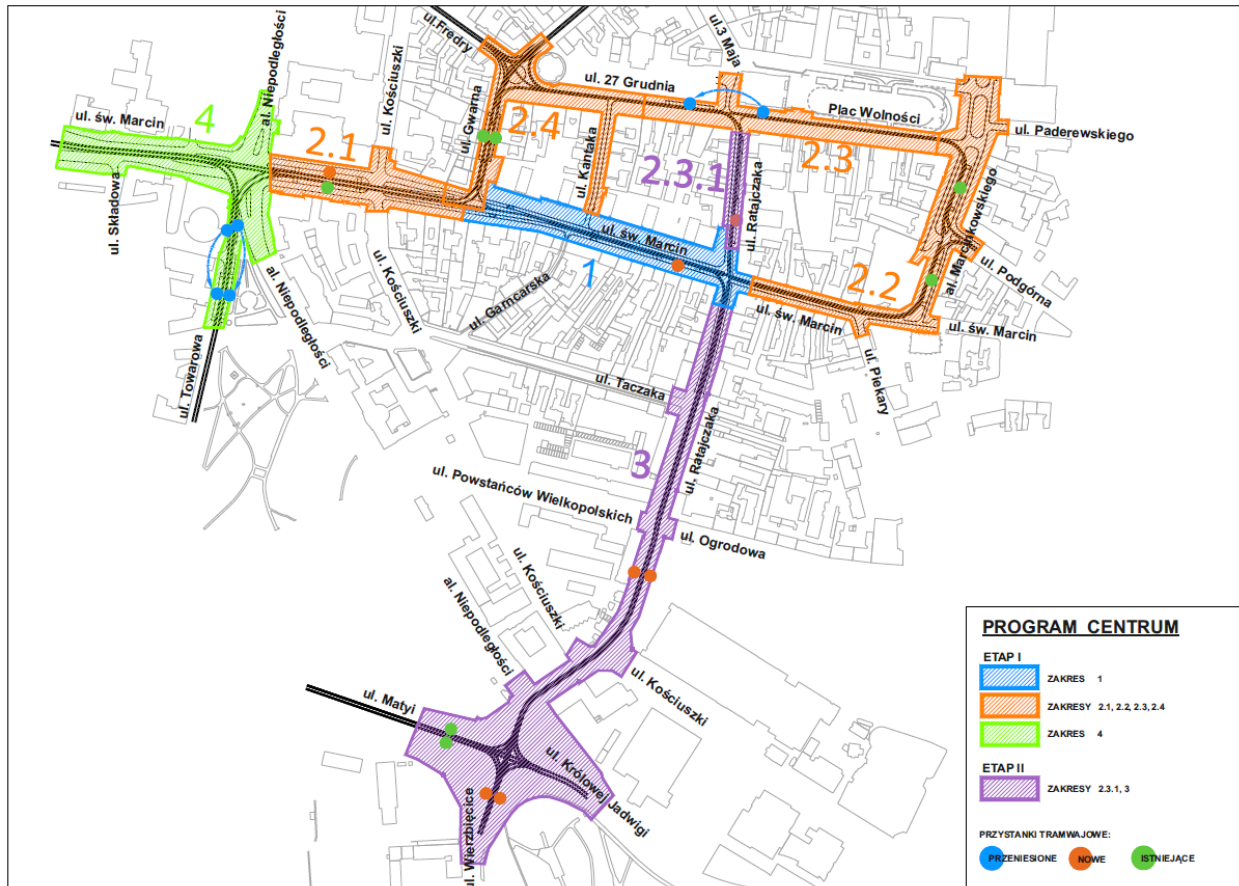

## 1. ul. Fredry

- Korekta ułożenia w-wy ścieralnej – strona Prawa od ul. Kościuszki do zakresu 2.4
- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego – po ostatecznym uzgodnieniu z MIR
- Renowacja słupów trakcyjnych

## 2. ul. Gwarna

- Budowa i przebudowa kanalizacji teletechnicznej – strona zachodnia
- Układanie nawierzchni z kostki – torowisko oraz perony – cały lipiec

### **3. ul. Mielżyńskiego**

- a. Prace wykończeniowe

### **4. Plac Gwarny**

- a. Usunięcie kolizji teletechnicznych, energetycznych kontynuacja
- b. Konstrukcja Torowiska w relacji Mielżyńskiego – Gwarny; Fredry-Gwarny, Fredry – 27 Grudnia, Gwarny – 27 Grudnia - kontynuacja
- c. Roboty brukarskie w chodnikach – kontynuacja

### **5. ul. 27 Grudnia**

- a. Usuwanie i przebudowy kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych kontynuacja – przebudowa kanalizacji ORANGE – robota dodatkowa
- b. Konstrukcja torowiska – kontynuacja – z wyłączeniem Okrągłaka
- c. Rozpoczęcie przebudowy Piwnic Okrągłaka

### **6. ul. Kantaka**

- a. Przebudowa ciepłociągu - kontynuacja
- b. Przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych - kontynuacja
- c. Montaż systemów antykompresyjnych – po usunięciu nieplanowanych kolizji SN – niestety dalej cisza w tym temacie – prawdopodobne usunięcie kolizji przez „zwarcie”

### **7. Skrzyżowanie Święty Marcin – Ratajczaka**

- a. Kontynuacja prac brukarskich
- b. Przełączenie gazociągu
- c. Zakończenie robót teletechnicznych i energetycznych

### **8. Plac Wolności**

- a. Budowa przyłączy kanalizacji ogólnospławnej - kontynuacja
- b. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych kontynuacja
- c. Budowa wodociągu - rozpoczęcie
- d. WZKIB – kontynuacja
- e. Konstrukcja torowiska od 0+106 do ul. Ratajczaka (w międzyczasie odwodnienie torowiska)

### **9. Ratajczaka**

- a. Budowa kanalizacji ogólnospławnej – zakończenie

- b. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych kontynuacja
- c. Budowa wodociągu – kontynuacja
- d. WZKIB – kontynuacja

**10. Ul. Św. Marcin (2.1 PC od Gwarnej do Kościuszki)**

- a. Układanie kostki kamiennej – jezdnia północna 01-07.07.2023

**11. ul. Św. Marcin (od Kościuszki do al. Niepodległości)**

- a. Regulacja wpustów i studni przed układaniem warstwy ścieralnej 17-21.07.2023
- b. Układanie warstwy ścieralnej SMA8 na ul. Św. Marcin strona północna i południowa 26-31.07.2023

**12. ul. Kościuszki**

- a. Regulacja wpustów i studni przed układaniem warstwy ścieralnej 17-21.07.2023
- b. Układanie warstwy ścieralnej SMA8 26-31.07.2023

**13. Al. Niepodległości**

- a. Układanie kostki - chodnik po stronie wschodniej i zachodniej przy placu Mickiewicza 10-31.07.2023
- b. Montaż okładziny kamiennej na murze oporowym przy placu Mickiewicza 12-18.07.2023
- c. Przebudowa gazociągu przy Placu Mickiewicza 5-7.07.2023
- d. Regulacja wpustów i studni przed układaniem warstwy ścieralnej 10-17.07.2023
- e. Układanie warstwy ścieralnej SMA8 po stronie wschodniej 26-31.07.2023

**14. Św. Marcin (od Mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości)**

- a. Układanie kostki na chodnikach po stronie północnej i południowej 01-31.07.2023
- b. Regulacja wpustów i studni przed układaniem warstwy ścieralnej 10-17.07.2023
- c. Układanie warstwy ścieralnej SMA8 na jezdni południowej 24-25.07.2023

**15. Ul. Św. Marcin (2.1 PC od Gwarnej do Kościuszki)**

- a. Układanie kostki kamiennej – jezdnia północna 01-07.07.2023

**16. ul. Św. Marcin (od Kościuszki do al. Niepodległości)**

- a. Regulacja wpustów i studni przed układaniem warstwy ścieralnej 17-21.07.2023
- b. Układanie warstwy ścieralnej SMA8 na ul. Św. Marcin strona północna i południowa 26-31.07.2023

**17. ul. Kościuszki**

- a. Regulacja wpustów i studni przed układaniem warstwy ścieralnej 17-21.07.2023
- b. Układanie warstwy ścieralnej SMA8 26-31.07.2023

**18. ul. Św. Marcin (od Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego)**

- a. Pielęgnacja zieleni

**19. Al. Marcinkowskiego**

- a. Pielęgnacja zieleni
