


Zakres zaplanowanych prac w obszarze inwestycji Program Centrum luty 2023 r.

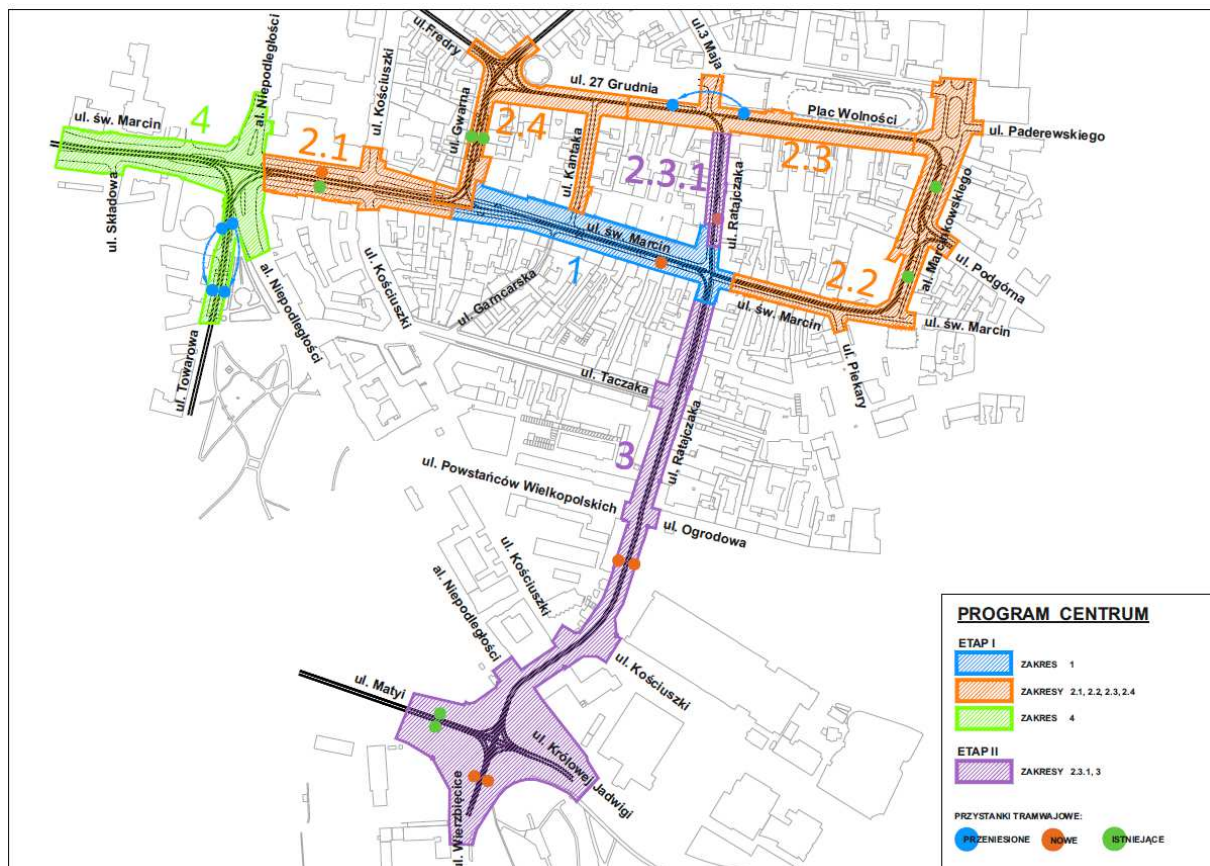

1. Ul. Św. Marcin (4 PC od Gwarnej do Kościuszki)

- Układanie kostki kamiennej – jezdnia 13-28.02.23
- Układanie kostki kamiennej - chodnik strona północna 06-28.02.23

2. ul. Kościuszki

- Przepięcie projektowanego wodociągu DN180 do istniejącego wodociągu (węzeł 14.5 zakres 2.1) 06.02.-08.02.2023
- Przebudowa komory ciepłowniczej 13-28.02.23

3. ul. Św. Marcin (od Kościuszki do al. Niepodległości)

- a. Nabudowanie studni na istniejącej kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż południowej strony ul. Św. Marcin 02.02.-13.02.2023
- b. Rozbiórka chodnika po stronie południowej przy Banku pocztowym 06-07.02.23
- c. Układanie krawężnika na ul. Św. Marcin strona południowa przy Banku pocztowym 8-10.02.23
- d. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy - chodnik po stronie południowej przy Banku Pocztowym 20-28.02.23

4. Al. Niepodległości

- a. Wykonanie wpustu drogowego WK22 wraz z przykanalikiem naprzeciwko 01.02-03.02.2023
- b. Wykonanie wpustu drogowego WK14 wraz z przykanalikiem 06.02-08.02.2023
- c. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy chodnik strona wschodnia między ul. Taylora a ul. Św. Marcin 20-28.02.23
- d. Budowa nowej kanalizacji nn i SN, przebudowa kanalizacji teletechnicznej jezdni zachodnia od Akademii Muzycznej w kierunku Fredry 1-17.02.23
- e. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy jezdni zachodnia od ul. Św. Marcin w kierunku Fredry 20-28.02.23
- f. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy torowiska – łuk torów E i F z Towarowej w kierunku Centrum 1-7.02.23
- g. Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego – łuk torów E i F z Towarowej w kierunku Centrum 8.02.23
- h. Układanie i kotwienie szyn - łuk torów E i F z Towarowej w kierunku Centrum 9-10.02.23
- i. Betonowanie nawierzchni torowiska - łuk torów E i F z Towarowej w kierunku Centrum 13-15.02.23
- j. Zalew przyszynowy - łuk torów E i F z Towarowej w kierunku Centrum 16-23.02.23

5. Św. Marcin (od Mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości)

- a. Wykonanie wodociągu DN180 wzdłuż północnej strony ul. Św. Marcin na odcinku od węzła W4 do węzła W8 08.02.-22.02.2023
- b. Montaż płyt torowych prefabrykowanych na tarczy skrzyżowania z al. Niepodległości – tor A i B w kierunku Centrum 1.02.23
- c. Układanie i kotwienie szyn na tarczy skrzyżowania z al. Niepodległości – tor A i B w kierunku Centrum 2-3.02.23

- d. Zalew przyszynowy na tarczy skrzyżowania z al. Niepodległości – tor A i B w kierunku Centrum 6-7.02.23
- e. Regulacja torowiska przy rondzie Kaponiera 1-15.02.23
- f. Frezowanie i rozbiórka nawierzchni – Św. Marcin strona północna od al. Niepodległości w kierunku ronda Kaponiera 14-17.02.23
- g. Wykonanie wpustów kanalizacji ogólnospławnej i przyłączy do budynków - Św. Marcin strona północna od Wieniawskiego w kierunku ronda Kaponiera 20-28.02.23

6. ul. Towarowa

- a. Przebudowa przyłącza sanitarnego Pk4 do Uniwersytetu Ekonomicznego 01.02.-10.02.2023
- b. Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej So11-D1 do 06.02.-10.02.2023
- c. Uporządkowanie terenu na odcinku kanalizacji ogólnospławnej So22istn. - So21 wraz z przepięciem wpustu drogowego „Wp3istn.” do nowej kanalizacji ogólnospławnej 01.02.-06.02.2023
- d. Przepięcie wpustów drogowych „Wp1istn.” oraz „Wp2istn.” do nowej kanalizacji ogólnospławnej 20.02.-24.02.2023
- e. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy - łuk torów C i D z ul. Św. Marcin w kierunku Towarowej 1-7.02.23
- f. Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego - łuk torów C i D z ul. Św. Marcin w kierunku Towarowej 8.02.23
- g. Układanie i kotwienie szyn - łuk torów C i D z ul. Św. Marcin w kierunku Towarowej 9-10.02.23
- h. Betonowanie nawierzchni torowiska - łuk torów C i D z ul. Św. Marcin w kierunku Towarowej 13-15.02.23
- i. Zalew przyszynowy - łuk torów C i D z ul. Św. Marcin w kierunku Towarowej 16-23.02.23.

7. ul. Fredry

- a. Wykonanie konstrukcji torowiska w Relacji Fredry-Mielżyńskiego do 31.01.2023
- b. Układanie szyn w płytach torowych na odcinku od Kościuszki-Gwarna do 15.02.2023
- c. Zalewanie szyn w ułożonych płytach – do 28.02.2023 (prace pod namiotem)
- d. Wykonanie antykorozyjnego zabezpieczenia belek poręczowych – robota dodatkowa do 28.02.2023 (o ile warunki pogodowe pozwolą)
- e. Usuwanie kolizji teletechnicznych i energetycznych kontynuacja (chodniki)

8. ul. Gwarna

- a. Budowa wodociągu strona Wschodnia 28.02.2023
- b. Budowa i przebudowa kanalizacji teletechnicznej – kontynuacja
- c. Budowa konstrukcji torowiska – kontynuacja
- d. Montaż rozjazdów Św. Marcin/Gwarna

9. ul. Mielżyńskiego

- a. Torowisko w korytach stalowych – 28.02.2023
- b. Opcjonalnie – przebudowa podziemnych kabli energetycznych – oczekiwanie na decyzję Zamawiającego do 28.02.2023

10. Plac Gwarny

- a. Roboty ziemne – kontynuacja
- b. Usunięcie kolizji teletechnicznych, energetycznych kontynuacja
- c. Przebudowa sieci Wodociągowej kontynuacja
- d. Konstrukcja Torowiska w relacji Mielżyńskiego - Gwarna do 28.02.2023 oraz Fredry-Gwarna, Fredry – 27 Grudnia, Gwarna – 27 Grudnia
- e. Wykonywanie fundamentów słupów trakcyjnych

11. ul. 27 Grudnia

- a. Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej w związku z bakiem możliwości przesadzenia/usunięcia drzew
- b. Przebudowa Gazociągu od ul. Kantaka do ul. Ratajczaka do 28.02.2023
- c. Usuwanie i przebudowy kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych kontynuacja

12. ul. Kantaka

- a. Przebudowa Gazociągu – do 28.02.2023
- b. Rozpoczęcie przebudowy Ciepłociągu
- c. Przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych kontynuacja
- d. Montaż systemów antykompresyjnych

13. Skrzyżowanie Święty Marcin – Ratajczaka

- a. Kanalizacja ogólnospławna – kontynuacja prac
- b. Przebudowa gazociągu

- c. Budowa konstrukcji torowiska w ul. Św. Marcin
- d. Montaż rozjazdów

14. Plac Wolności

- a. Budowa kanalizacji ogólnospławnej - kontynuacja
- b. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych kontynuacja

15. ul. Św. Marcin (od Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego)

- a. Roboty poprawkowe związane z montażem włączników/pokryw studni telekomunikacyjnych wraz z wypełnieniem kostką kamienną 01-28.02.2023
- b. Montaż elementów małej architektury 01-28.02.2023

16. Al. Marcinkowskiego

- a. Montaż elementów małej architektury 01-28.02.2023
- b. Roboty poprawkowe związane z montażem włączników/pokryw studni telekomunikacyjnych wraz z wypełnieniem kostką kamienną 01-28.02.2023.
