


# Zakres zaplanowanych prac w obszarze inwestycji Program Centrum maj 2023 r.

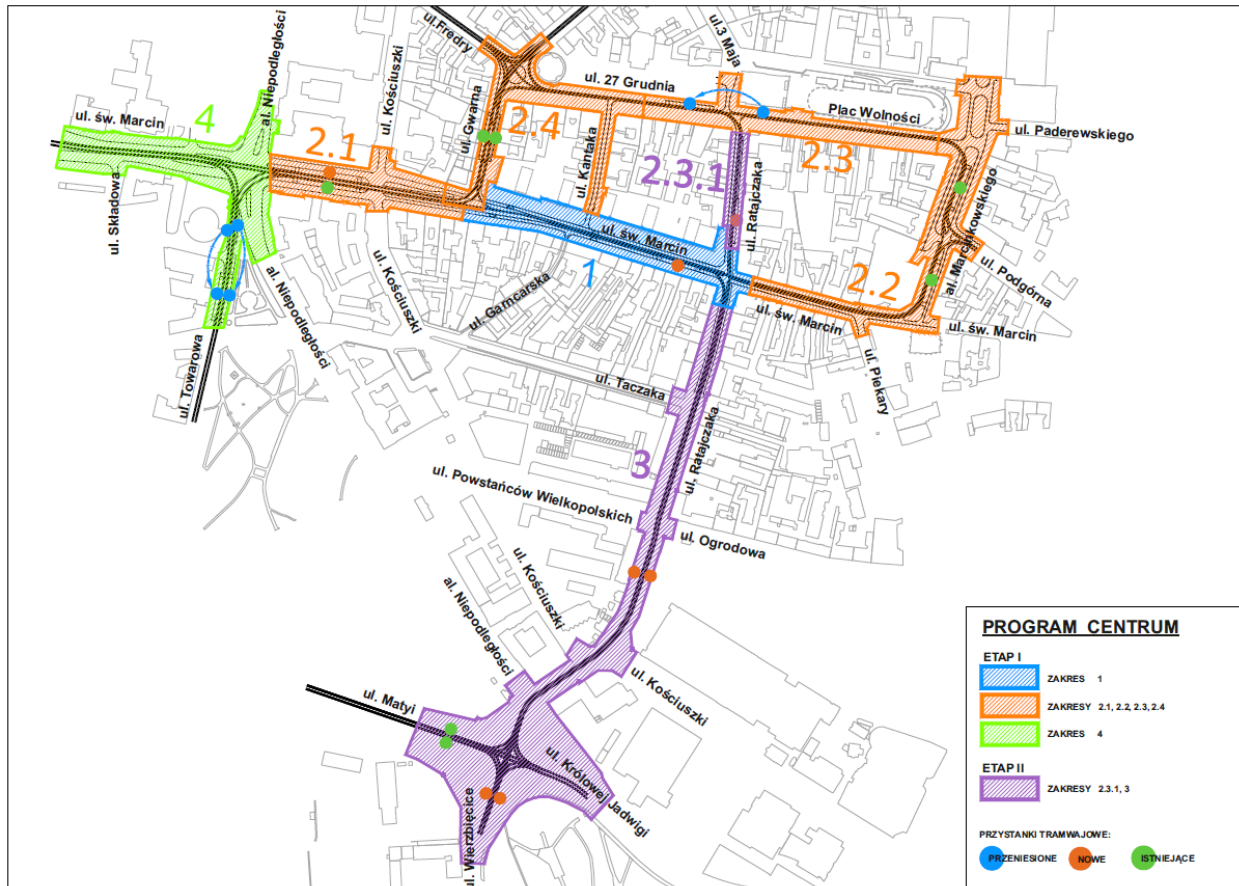

## 1. Ul. Św. Marcin (2.1 PC od Gwarnej do Kościuszki)

- a. Układanie kostki kamiennej – jezdnia 04-31.05.2023
- b. Układanie kostki kamiennej - chodnik strona północna 15-31.04.23
- c. Montaż elementów małej architektury 08-12.05.2023
- d. Uruchomienie tramwaju 13.05.2023

## 2. ul. Kościuszki

- a. Wykonanie warstw bitumicznych (podbudowy AC22P i AC16W) strona południowo - zachodnia 10-11.05.2023

### **3. ul. Św. Marcin (od Kościuszki do al. Niepodległości)**

- a. Wykonanie warstw bitumicznych (podbudowy AC22P i AC16W) na ul. Św. Marcin strona południowa 10-11.05.2023
- b. Układanie kostki - chodnik po stronie południowej przy Banku Pocztowym 04-08.05.2023
- c. Montaż elementów małej architektury 08-12.05.2023

### **4. Al. Niepodległości**

- a. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy - chodnik po stronie wschodniej od CK Zamek w kierunku Fredry 15-19.05.2023
- b. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy - chodnik po stronie wschodniej od Taylora w kierunku ul. Św. Marcin 08-12.05.2023
- c. Układanie kostki - chodnik po stronie wschodniej 15-31.05.2023
- d. Wykonanie muru oporowego przy skarpie placu Mickiewicza 22-26.05.2023
- e. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy - chodnik po stronie zachodniej przy placu Mickiewicza 29-31.05.2023

### **5. Św. Marcin (od Mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości)**

- a. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy – chodnik po stronie północnej 15-18.05.2023
- b. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy – chodnik po stronie południowej 18-20.05.2023
- c. Układanie kostki na chodnikach po stronie północnej i południowej 19-31.05.2023

### **6. ul. Fredry**

- a. Odtworzenie pętli indukcyjnych – po wykonaniu warstw bitumicznych odcinek 2 i 3 – po 08.05.2023
- b. odtworzenie nawierzchni bitumicznych – po 8.05.2023
- c. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego – po 10-12.05.2023
- d. Wykonanie antykorozji belek poręczowych – robota dodatkowa po 02.05.2023
- e. Renowacja słupów trakcyjnych – po 04.05.2023

### **7. ul. Gwarna**

- a. Budowa i przebudowa kanalizacji teletechnicznej – strona zachodnia
- b. Montaż szyn torowiska– kontynuacja – cały maj

- c. Układanie nawierzchni z kostki – cały maj
- d. Roboty brukarskie w chodniku- zachód – rozpoczęcie

#### **8. ul. Mielżyńskiego**

- a. Torowisko w korytach stalowych – spoinowanie żywicami i układanie jezdni – zakończenie.
- b. Oznakowanie pionowe i poziome

#### **9. Plac Gwarny**

- a. Usunięcie kolizji teletechnicznych, energetycznych kontynuacja
- b. Konstrukcja Torowiska w relacji Mielżyńskiego - Gwarna do 28.02.2023 oraz Fredry-Gwarna, Fredry – 27 Grudnia, Gwarna – 27 Grudnia - kontynuacja
- c. Roboty brukarskie w chodnikach cały maj 2023

#### **10. ul. 27 Grudnia**

- a. Usuwanie i przebudowy kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych kontynuacja
- b. Konstrukcja torowiska – kontynuacja – z wyłączeniem okrągłaka

#### **11. ul. Kantaka**

- a. Rozpoczęcie przebudowy Ciepłociągu
- b. Przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych - kontynuacja
- c. Montaż systemów antykompresyjnych – po usunięciu nieplanowanych kolizji SN

#### **12. Skrzyżowanie Święty Marcin – Ratajczaka**

- a. Rozwieszenie sieci trakcyjnej
- b. Roboty brukarskie – do przejezdności skrzyżowania do 10.05.2023 ; pozostałą część kontynuacja

#### **13. Plac Wolności**

- a. Budowa przyłączy kanalizacji ogólnospławnej - kontynuacja
- b. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych kontynuacja
- c. Budowa wodociągu - rozpoczęcie
- d. WZKIB – kontynuacja
- e. Roboty ziemne pod torowisko – odcinek od 0+106 do ul. Ratajczaka (w międzyczasie odwodnienie torowiska)
- f. podbudowy pod torowisko – po robotach ziemnych

#### **14. Ratajczaka**

- a. Budowa kanalizacji ogólnospławnej – kontynuacja
- b. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych kontynuacja
- c. Budowa wodociągu – kontynuacja
- d. WZKIB – kontynuacja

Po przełożeniu ruchu w ul. Św. Marcin zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego

#### **15. ul. Św. Marcin (od Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego)**

- a. Montaż elementów małej architektury 01-31.05.2023
- b. Montaż oznakowania pionowego 01-31.05.2023
- c. Wykonywanie oznakowania poziomego 22-31.05.2023

#### **16. Al. Marcinkowskiego**

- a. Montaż elementów małej architektury 01-31.05.2023
- b. Montaż oznakowania pionowego 01-30.04.2023
- c. Wykonywanie oznakowania poziomego 22-31.05.2023
