


Zakres zaplanowanych prac w obszarze inwestycji Program Centrum marzec 2023 r.

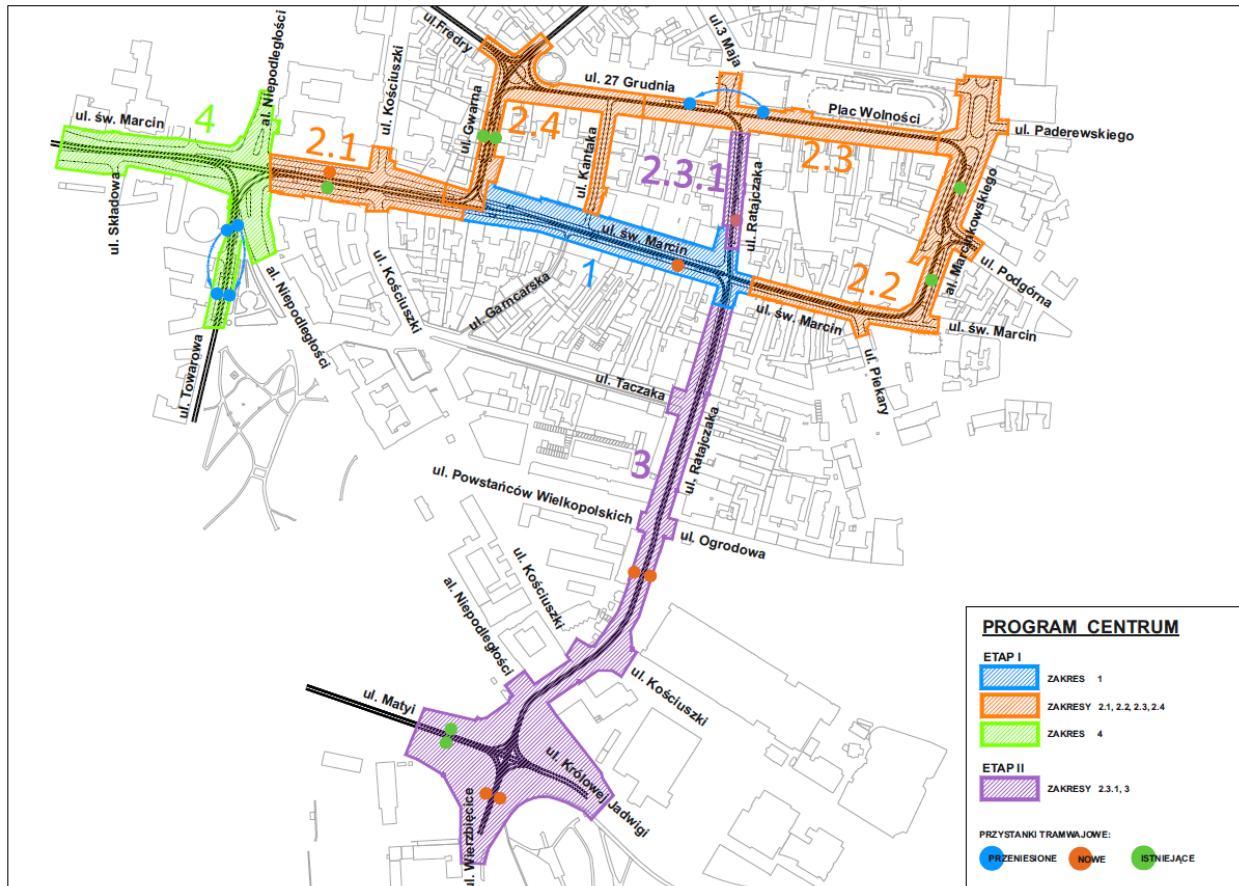

1. Ul. Św. Marcin (2.1 PC od Gwarnej do Kościuszki)

- Układanie kostki kamiennej – jezdnia 20-31.03.23
- Układanie kostki kamiennej - chodnik strona północna 01-31.03.23
- Układanie kostki kamiennej - chodnik strona południowa 01-31.03.23

2. ul. Kościuszki

- Przebudowa komory ciepłowniczej 01-14.03.23
- Wykonanie warstw bitumicznych (podbudowy AC22P i AC16W) strona zachodnia 09-10.03.23

3. ul. Św. Marcin (od Kościuszki do al. Niepodległości)

- a. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy - chodnik po stronie południowej przy Banku Pocztowym 20-31.03.23
- b. Wykonanie warstw bitumicznych (podbudowy AC22P i AC16W) na ul. Św. Marcin strona południowa 21-22.03.23
- c. Renowacja wodociągu w chodniku po stronie południowej 15-31.03.23

4. Al. Niepodległości

- a. Wykonanie warstw podbudowy jezdni zachodnia od ul. Św. Marcin w kierunku Fredry 06-08.03.23
- b. Wykonanie warstw bitumicznych (podbudowy AC22P i AC16W) od ul. Św. Marcin do ul. Taylora strona zachodnia 07-08.03.23
- c. Wykonanie płyty podtorowej – łuk torów C+D i E+F z Towarowej w kierunku Centrum 04-06.03.23
- d. Układanie i kotwienie szyn - łuk torów C+D i E+F z Towarowej w kierunku Centrum 07-08.03.23
- e. Betonowanie nawierzchni torowiska - łuk torów C+D i E+F z Towarowej w kierunku Centrum, rozjazd C 09-12.03.23
- f. Zalew przyszynowy - łuk torów C+D, E+F z Towarowej w kierunku Centrum, rozjazd C 13-31.03.23

5. Św. Marcin (od Mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości)

- a. Regulacja torowiska przy rondzie Kaponiera 1-15.03.23
- b. Wykonanie warstw bitumicznych (podbudowy AC22P i AC16W) na ul. Św. Marcin strona południowa 23-24.03.23
- c. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy na ul. Św. Marcin strona północna 20-24.03.23
- d. Wykonanie warstw bitumicznych (podbudowy AC22P i AC16W) na ul. Św. Marcin strona północna 27-28.03.23
- e. Wykonanie przyłączy i wpustów po stronie północnej 01-15.03.23
- f. Nabudowanie studni wodomierzowych, próba szczelności, pobranie próbek i przepięcie wodociągu po stronie północnej 01-21.03.23

6. ul. Towarowa

- a. Wykonanie wpustów i przyłączy 01-15.03.23

- b. Odtworzenie nawierzchni torowiska przy skrzyżowaniu ze Składową 15-16.03.23
- c. Układanie kostki na chodniku i peronie po stronie zachodniej 6-31.03.23

7. ul. Fredry

- a. Odtworzenie pętli indukcyjnych – do 15.03.2023
- b. Frezowanie i odtworzenie nawierzchni bitumicznych – do 31.03.2023
- c. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego – do 31.03.2023
- d. Wykonanie antykorozji belek poręczowych – robota dodatkowa do 20.03.2023 (o ile warunki pogodowe pozwolą)
- e. Usuwanie kolizji teletechnicznych i energetycznych kontynuacja (chodniki) – do 15.03.2023
- f. Renowacja słupów trakcyjnych – do 31.03.2023
- g. Rozciąganie sieci trakcyjnej płaskiej – do 31.03.2023

8. ul. Gwarna

- a. Budowa wodociągu strona Wschodnia 28.02.2023
- b. Budowa i przebudowa kanalizacji teletechnicznej – kontynuacja
- c. Montaż szyn torowiska– kontynuacja – cały marzec
- d. Układanie nawierzchni z kostki – cały marzec
- e. Roboty brukarskie – cały marzec

9. ul. Mielżyńskiego

- a. Torowisko w korytach stalowych – 10.03.2023
- b. Zalew koryt i szyn – 10.03.2023
- c. Konstrukcja drogowa pod odtworzenie nawierzchni – do 10.03.2023
- d. Połączenie ul. Mielżyńskiego systemem płyt prefabrykowanych – do 10.03.2023
- e. Montaż szyn w płytach prefabrykowanych – do 13.03.2023
- f. Zalew szyn w płytach – do 16.03.2023
- g. Opcjonalnie – przebudowa podziemnych kabli energetycznych – oczekiwanie na decyzję Zamawiającego do 10.03.2023

10. Plac Gwarny

- a. Usunięcie kolizji teletechnicznych, energetycznych kontynuacja

- b. Przebudowa sieci Wodociągowej kontynuacja- prace w chodniku – do 25.03.2023
- c. Konstrukcja Torowiska w relacji Mielżyńskiego - Gwarna do 28.02.2023 oraz Fredry-Gwarna, Fredry – 27 Grudnia, Gwarna – 27 Grudnia - kontynuacja
- d. Wykonywanie fundamentów słupów trakcyjnych – do 30.03.2023
- e. Montaż rozjazdów (Fredry oraz Mielżyńskiego) do 15.03.2023
- f. Układanie szyn między rozjazdami – do 25.03.2023
- g. Roboty brukarskie na relacji Fredry-Mielżyńskiego – do 31.03.2023

11. ul. 27 Grudnia

- a. Usuwanie i przebudowy kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych kontynuacja
- b. Montaż kanalizacji trakcyjnej oraz systemu ogrzewania i sterowania zwrotnicami do 31.03.2023
- c. Konstrukcja torowiska – do 30.03.2023

12. ul. Kantaka

- a. Przebudowa Gazociągu – do 20.03.2023
- b. Przebudowa Gazociągu od ul. Kantaka do ul. Ratajczaka do 15.03.2023 - przyłącza
- c. Rozpoczęcie przebudowy Ciepłociągu – 20.03.2023 – 31.03.2023
- d. Przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych - kontynuacja
- e. Montaż systemów antykompresyjnych – do 20.03.2023

13. Skrzyżowanie Święty Marcin – Ratajczaka

- a. Kanalizacja ogólnospławna – kontynuacja prac – ul. Ratajczaka
- b. Wykopy i wylewanie fundamentów słupów trakcyjnych
- c. Montaż skrzyżowania – do 10.03.2023

14. Plac Wolności

- a. Budowa kanalizacji ogólnospławnej - kontynuacja
- b. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych kontynuacja
- c. Budowa przyłączy gazociągowych – do 20.03.2023
- d. Budowa wodociągu – do 31.03.2023
- e. WZKIB – 31.03.2023

15. Ratajczaka

- a. Budowa kanalizacji ogólnospławnej – do 31.03.2023
- b. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych kontynuacja
- c. Budowa wodociągu – do 31.03.2023 – strona W i Z
- d. WZKIB – 15.03.2023

16. ul. Św. Marcin (od Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego)

- a. Roboty poprawkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej 01-31.03.2023
- b. Montaż elementów małej architektury 01-31.03.2023

17. Al. Marcinkowskiego

- a. Montaż elementów małej architektury 01-31.03.2023
- b. Roboty poprawkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej 01-31.03.2023
- c. Układanie nawierzchni chodników z kostki kamiennej na wyspie przed Muzeum Narodowym 01-31.03.2023r.
- d. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej na jezdni 13-31.03.2023r.
