


# Zakres zaplanowanych prac w obszarze inwestycji Program Centrum styczeń 2023 r.

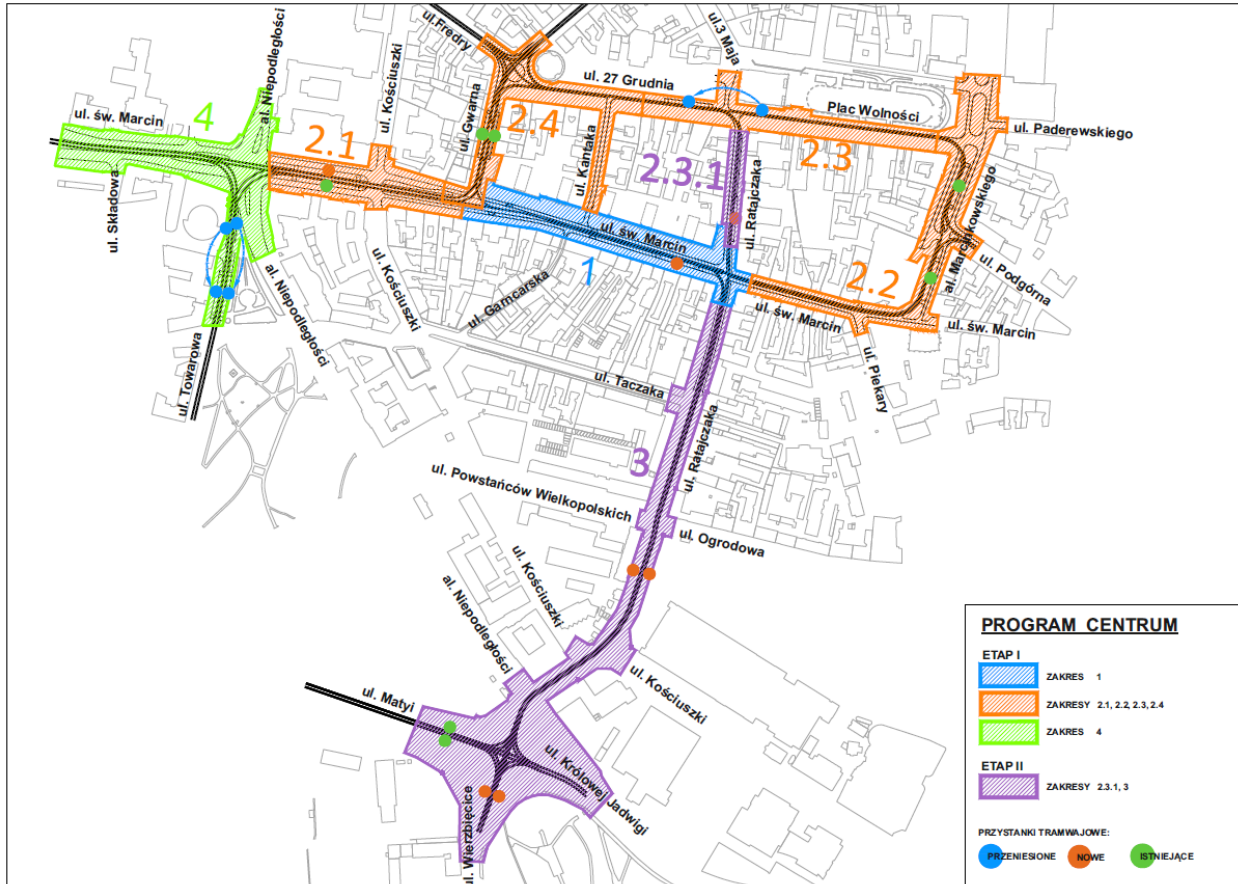

- 1. Ul. Św. Marcin (4 PC od Gwarnej do Kościuszki)**
  - a. Układanie kostki Gabro – jezdnia 09.01-31.01
  - b. Układanie kostki kamiennej - chodnik strona południowa 02.01-05.01
- 2. ul. Kościuszki**
  - a. Przebudowa komory ciepłowniczej 16.01-31.01
- 3. ul. Św. Marcin (od Kościuszki do al. Niepodległości)**
  - a. Remont sieci gazowej 16.01-31.01
  - b. Rozbiórka chodnika po stronie północnej przy CK Zamek 02.01-05.01

- c. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy - chodnik po stronie północnej przy CK Zamek 09.01-13.01
- d. Układanie nawierzchni z kostki betonowej - chodnik po stronie północnej przy CK Zamek 16.01-31.01

#### **4. Al. Niepodległości**

- a. Frezowanie i rozbiórka nawierzchni – jezdnia zachodnia od Akademii Muzycznej w kierunku Fredry 3.01-10.01
- b. Wykonanie kanalizacji deszczowej – jezdnia zachodnia od Akademii Muzycznej w kierunku Fredry 11.01-20.01
- c. Budowa nowej kanalizacji nn i SN, przebudowa kanalizacji teletechnicznej jezdni zachodnia od Akademii Muzycznej w kierunku Fredry 23.01-31.01

#### **5. Św. Marcin (od Mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości)**

- a. Wykonanie warstw bitumicznych (AC22P i AC16W) południowa strona ul. Św. Marcin 09.01-10.01
- b. Regulacja torowiska przy rondzie Kaponiera 03.01-31.01
- c. Frezowanie i rozbiórka nawierzchni – Św. Marcin strona północna od Wieniawskiego w kierunku ronda Kaponiera 11-13.01
- d. Wykonanie wpustów kanalizacji ogólnospławnej i przyłączy do budynków - Św. Marcin strona północna od Wieniawskiego w kierunku ronda Kaponiera 16.01-31.01
- e. Rozbiórka torowiska na tarczy skrzyżowania Św. Marcin/al. Niepodległości 3.01-10.01
- f. Wykonanie odwodnienia torowiska na tarczy skrzyżowania Św. Marcin/al. Niepodległości 11.01-25.01
- g. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy tor A i B na tarczy skrzyżowania Św. Marcin/al. Niepodległości 26.01-31.01

#### **6. ul. Towarowa**

- a. Rozbiórka torowiska przy Akademii Muzycznej 3.01-10.01
- b. Wykonanie odwodnienia torowiska przy Akademii Muzycznej 11.01-25.01
- c. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy tor C i D przy Akademii Muzycznej 26.01-31.01
- d. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 02.01-31.01
- e. Budowa kanału ogólnospławnego 02.01-31.01

**7. ul. Św. Marcin (od Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego)**

- a. Roboty wykończeniowe związane z montażem włazów/pokryw studni telekomunikacyjnych wraz z wypełnieniem kostką kamienną 02-31.01.2023
- b. Montaż elementów małej architektury 02-31.01.2023

**8. Al. Marcinkowskiego**

- a. Wykonywanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na jezdni zachodniej na wysokości placu Wolności 02-31.01.2023
- b. Wykonanie nawierzchni chodnika na płycie placu Wolności 02-31.01.2023
- c. Wykonanie odtworzenia chodnika przy Bibliotece Raczyńskich
- d. Regulacja wpustów przed robotami brukarskimi – na bieżąco wraz z postępem robót brukarskich
- e. Montaż elementów małej architektury 02-31.01.2023
- f. Montaż rzeźby Stela wraz z wykonaniem nawierzchni kamiennej wokół rzeźby 02-31.01.2023

**9. Ul. Fredry**

- a. Dokończenie układania płyt podtorowych Kościuszki-Gwarna do 31.01.2023
- b. Wykonanie konstrukcji torowiska w Relacji Fredry-Mielżyńskiego do 31.01.2023
- c. Układanie szyn w płytach torowych na odcinku od Most Teatralny – Niepodległości-Kościuszki-Gwarna do 31.01.2023 (o ile warunki pogodowe pozwolą)
- d. Wykonanie antykorozji belek poręczowych – robota dodatkowa do 31.01.2023 (o ile warunki pogodowe pozwolą)
- e. Usuwanie kolizji teletechnicznych i energetycznych kontynuacja

**10. Ul. Gwarna**

- a. Budowa Kanalizacji ogólnospławnej – wg Karty Nadzoru Autorskiego - do 31.01.2023
- b. Budowa wodociągu strona P 02.12-30.12 (po przełożeniu ruchu na płytę torowiska) do 31.01.2023
- c. Budowa i przebudowa kanalizacji teletechnicznej – kontynuacja
- d. Budowa konstrukcji torowiska – kontynuacja

**11. Ul. Mielżyńskiego**

- a. Przełączenia Rynnowe do 31.01.2023
- b. Renowacja wodociągu – kontynuacja do 31.01.2023

- c. Opcjonalnie – przebudowa podziemnych kabli energetycznych – oczekiwanie na decyzję Zamawiającego do 31.01.2023

#### **12. Plac Gwarny**

- a. Roboty ziemne – kontynuacja
- b. Usunięcie kolizji teletechnicznych, energetycznych kontynuacja
- c. Przebudowa sieci Wodociągowej kontynuacja
- d. Konstrukcja Torowiska w relacji Mielżyńskiego-Gwarny do 31.01.2023

#### **13. Ul. 27 Grudnia**

- a. Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej w związku z bakiem możliwości przesadzenia/usunięcia drzew
- b. Przebudowa Gazociągu od ul. Kantaka do ul. Ratajczaka do 31.01.2023
- c. Rozpoczęcie usuwania i przebudowy kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych kontynuacja

#### **14. Ul. Kantaka**

- a. Przebudowa Gazociągu – do 31.01.2023
- b. Rozpoczęcie przebudowy Ciepłociągu
- c. Przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych kontynuacja

#### **15. Skrzyżowanie Święty Marcin – Ratajczaka**

- a. Kanalizacja ogólnospławna – kontynuacja prac

#### **16. Plac Wolności**

- a. Dokończenie robót torowiska
- b. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych kontynuacja
- c. Kanalizacja ogólnospławna – od 09.01.2023
